



# Gestión de la Biblioteca Virtual de la Cooperación Internacional

Principales experiencias 2007 - 2008 junio

Maria del Pilar Acha

**Seminario Internacional Library Connect**  
**Bibliotecas digitales: tendencias y perspectivas**

Lima, 25 de setiembre de 2008



Biblioteca Virtual  
de la Cooperación  
Internacional

# Contenido

- ◆ ¿ Cuáles fueron sus objetivos?
- ◆ ¿Como se gestó y desarrolló el Proyecto?
- ◆ Fases iniciales y estrategias de implementación y desarrollo
- ◆ Principales experiencias y lecciones aprendidas

# 1. ¿Cuáles fueron sus objetivos y qué ofrece el Proyecto?

- ✓ Acceso a la documentación de los proyectos de desarrollo generada por la cooperación internacional.
- ✓ Coadyuvar la mejora en la elaboración de proyectos de desarrollo, a través del desarrollo de capacidades locales.
- ✓ Fortalecer institucionalmente a la BNP



## ¿En qué consistió el trabajo de la BVCI?

---

Recopilar, preservar, organizar, catalogar, digitalizar, motivar, capacitar, difundir por medio de las nuevas tecnologías, la información sobre los proyectos de cooperación internacional y el desarrollo en el Perú.




## 2. ¿Cómo se gestó y desarrolló el Proyecto?

---

- Contar con un equipo de recursos humanos y consultores calificados, previo concurso según normativa de contratación del PNUD.
- Investigación de las mejores prácticas y experiencias sobre la materia.
- Estudio cualitativo sobre la Bib. Virtual de la Cooperación y mercado de información.
- Compartir experiencias a través de foros, seminarios y talleres.

# Procesos y flujos en la gestión del Proyecto de la BVCI

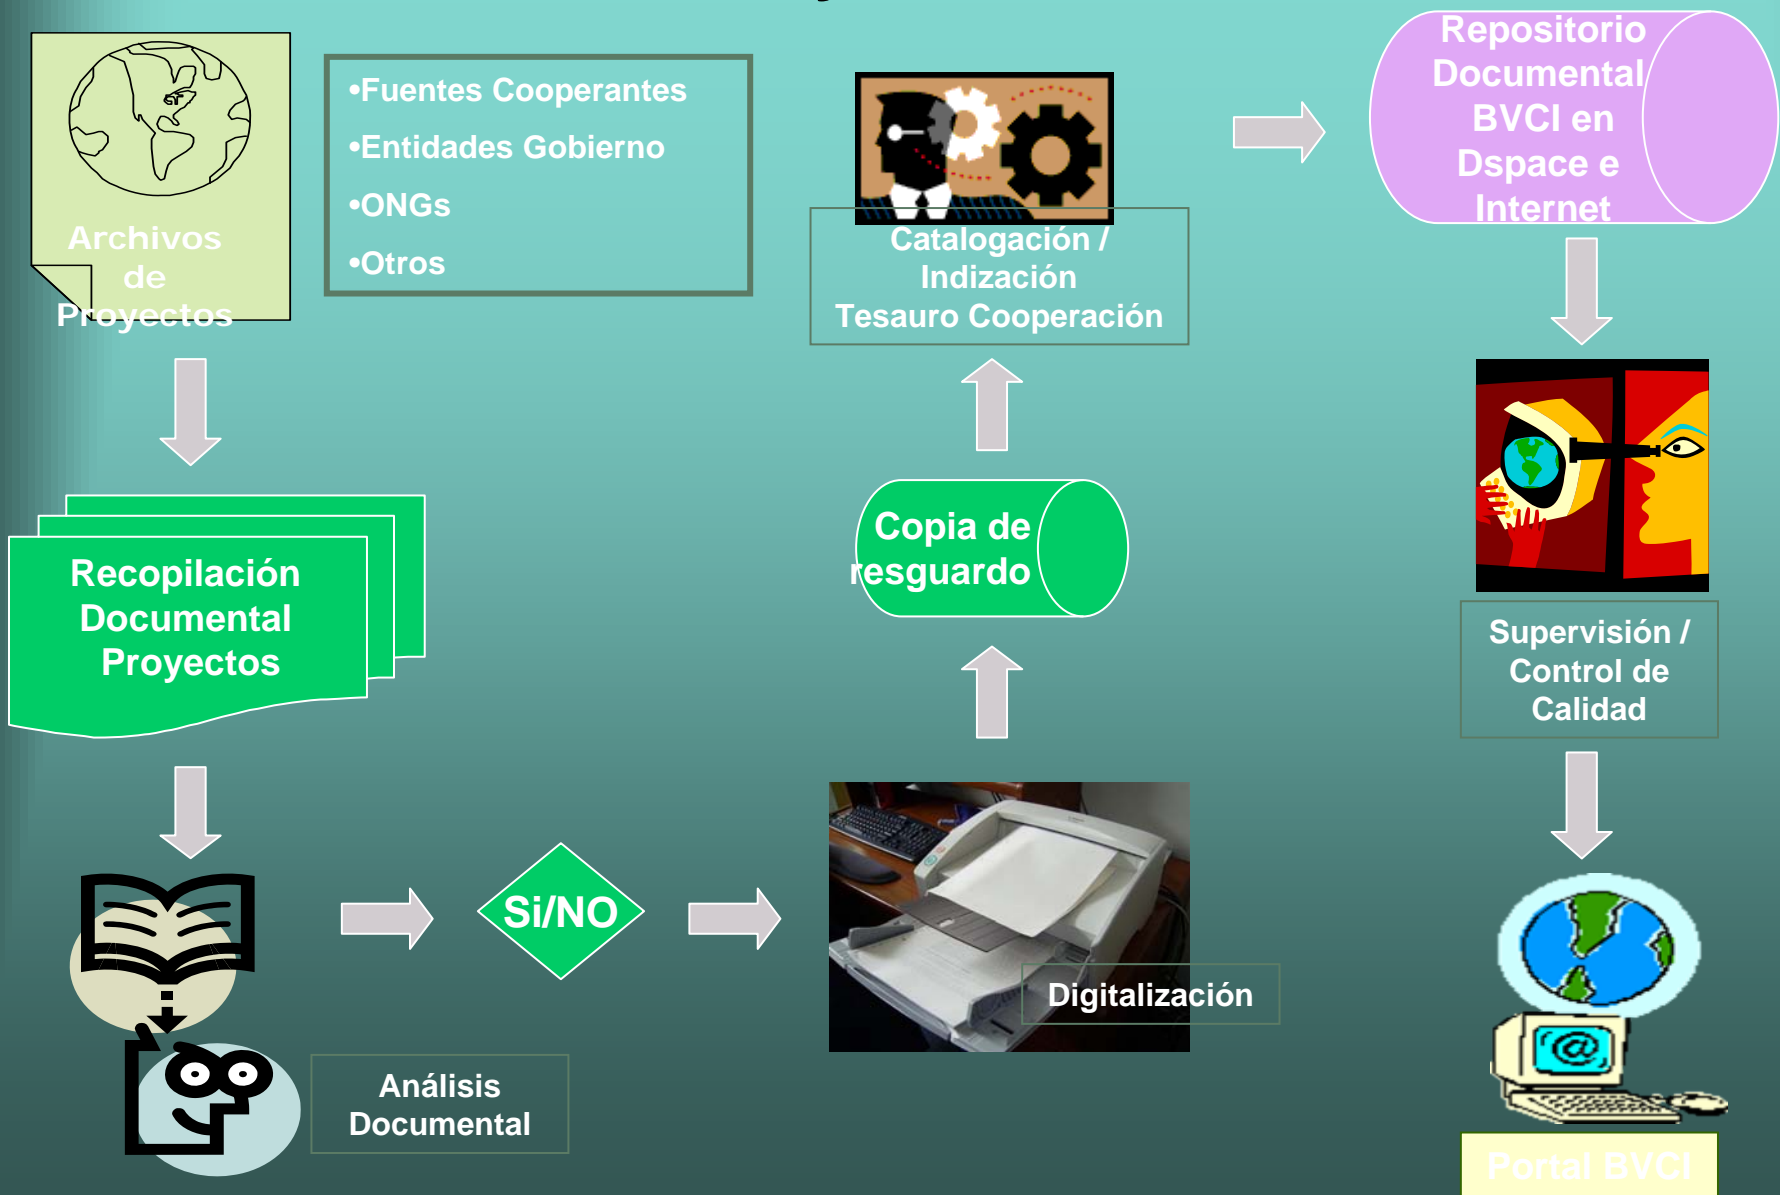

# Resultados y actividades en el 2007 (Fase 1)

R1	Diagnóstico del estado situacional de los archivos de proyectos de desarrollo sobre Perú (agencias ONU, APCI, RR.EE.)	Mayo – Junio
R2	Estudio de necesidades de información en Cooperación Internacional y bibliotecas virtuales	Jun. Julio
R3	Documento de lineamientos y criterios para la selección documental	Junio
R4	Contratación de consultores y recursos humanos. Personal de la BNP, APCI y ONU debidamente informado en la gestión de la Bib. Virtual	Mayo –Oct.
R5	Documentos de Proyectos ordenados y seleccionados listos para la digitalización	Ago-Set. Oct.
R6	Biblioteca Virtual con equipos informáticos, diseñada, puesta a prueba	Nov. Dic.

## 2008

### Principales resultados

R1	Archivos y documentos de proyectos escaneados en archivos electrónicos, debidamente clasificados, etiquetados y verificados
R2	Biblioteca Virtual de la Cooperación diseñada. Lanzamiento, puesta en marcha y pleno funcionamiento, actualización.
R3	Capacitación al personal de la BNP en el marco de transferencia del Proyecto.
R4	Documentos, manuales, normas de Uso y Gestión de la Biblioteca Digital en Cooperación Internacional editados.
R5	Biblioteca Virtual en Cooperación Internacional con aliados estratégicos que brindan apoyo y financiamiento

Diciembre 2007 –  
Julio 2008

Abril de 2008 en  
adelante

Marzo a junio  
2008

Abril 2008 en  
adelante

# Lecciones Aprendidas

1. Organización documental: Cada institución aportante de proyectos se organiza bajo un esquema particular, que en algunos casos no guarda relación con los criterios de selección de la BVCI.
2. Recursos humanos especializados y calificados: Autonomía para contratar a profesionales, técnicos y consultores especializados formando equipos multidisciplinarios.

# Lecciones Aprendidas

3. Digitalización de los documentos: Este proceso toma tiempo dependiendo de la calidad del soporte tratado.
4. Elaboración de vocabularios especializados 'a medida': Necesidad de conciliar la variada terminología de los diversos repositorios documentales con los términos locales y el lenguaje especializado; acorde a las necesidades de búsqueda de los usuarios y la actualización terminológica propia de cada área temática.

# Lecciones Aprendidas

5. La implementación de la BVCI no ha supuesto necesariamente etapas consecutivas, sino su desarrollo en forma simultánea o paralelas.
6. Plataforma tecnológica: La BVCI ha implicado trabajo en equipo y multidisciplinario: informáticos, profesionales de la información, especialistas en comunicación y marketing, gerentes sociales, etc.

# Lecciones Aprendidas

7. Comunicación del Proyecto: Estrategias comunicacionales diferenciadas :
- Interna: Personal de la BNP, APCI, PNUD
  - Externa: Aliados estratégicos, contrapartes del Proyecto.
  - Hacia el público: Usuarios especializados, medios de comunicación.

# Lecciones Aprendidas

## 8. Coordinación entre contrapartes:

- Compromisos basados en la realidad organizacional, documental de cada 'partner', consistentes con su misión, visión y objetivos; así como en su voluntad política.
- Alta rotación de funcionarios y de personal.

# Lecciones Aprendidas

## 9. Transferencia de conocimientos:

Implica:

- "Resistencia al cambio"
- Nivel de conocimientos
- Período de transición: Acompañamiento, procesamiento, incorporación, uso y creación de nuevo conocimiento.
- Ajustes organizacionales y monitoreo
- Costos : Financieros, Recursos Humanos, espacio y tiempo.

# La BVCI y Gestión del conocimiento



Transferencia de conocimiento

Visitas y reuniones de motivación y coordinación



Actualización de la Información de Normativas

Seguimiento y Monitoreo

- Cooperantes U. Europea, USA
- ONGs, Gobiernos regionales y locales
- Universidades

Gestión del conocimiento cooperación internacional en el Perú

Calidad en la gestión

Descentralización y difusión

Transferencia de Conocimientos a Gob. Regionales

Fortalecer capacidades

Transferencia de Conocimientos Experiencias del Proyecto a la BNP y APCI





Biblioteca Virtual  
de la Cooperación  
Internacional

**!Muchas gracias por su atención  
y al equipo humano que lo hizo  
posible !**
